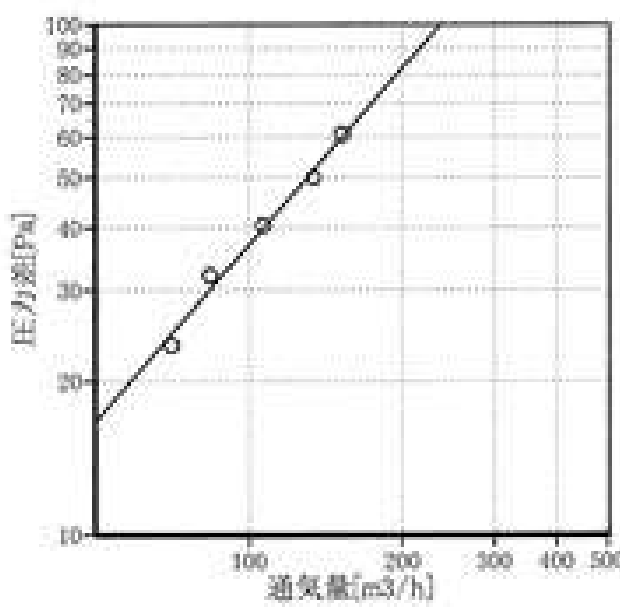


住宅の気密性能試験結果(1)

依頼者	名 称	華建築 株式会社	
	住 所	滋賀県近江八幡市小船木町721-15	
測定対象建物の概要			
建物の名称		〇〇様邸 新築工事	
所在地		滋賀県米原市〇〇〇〇	
竣工年月日		2015/03/28	
工法及び構造		在来木造工法	
建物の規模	地階床面積	- m ²	
	1階床面積	78.96 m ²	
	2階床面積	57.97 m ²	
	3階床面積	- m ²	
	延べ床面積	136.93 m ² …(A)	
開口部の仕様		窓	2重窓(引き違い・外開き・内開き)
		玄関	外開き戸
気密層の仕様			
建物概要図		別紙添付図面の通り	
通気量測定位置		添付平面図に示す	
測定時の建物条件			
	部位	方法	有無及び状況の確認
1	建物外皮にあるドア・窓	ロック(施錠)だけ	有
2	天井・床下改め口	普通に閉めた状態	無
3	郵便受け	普通に閉めた状態	無
4	車庫に通じるドア	普通に閉めた状態	無
5	基壇と床の両方を断熱している地下へ通じるドア	普通に閉めた状態	無
6	換気レジスター	シャッター閉または目張り	有
7	自然レンジファン	シャッター閉または目張り	有
8	換気扇・天井扇	シャッター閉または目張り	無
9	FP式以外の煙突の穴	ダンパー閉または目張り	無
10	屋外に通じる排水管	封水または管口を目張り	無
11	集中換気システムの給排気ダクトの屋外側出入口	シャッター閉または目張り	無
12	建物外皮の外側にある開口部	普通に開けた状態	無
測定対象外にした部分(空間)の名称			
測定対象外にした部分で延べ床面積(A)に含まれる床面積		- m ² … (B)	
吹抜け・床下・小部屋など測定対象の相当床面積		15.03 m ² … (C)	
測定対象とした建物の実質延べ床面積(S)		S = A-B+C = 151.90 m ²	

住宅の気密性能試験結果(2)

測定方法・測定装置										
測定方法	JIS A 2201 (送風機による住宅等の気密性能試験方法)による (減圧法) 気量および圧力差の測定は、あらかじめ校正した測定装置を使用して行った。									
測定装置	コーナー札幌株式会社 KNS-2500C型									
測定結果										
試験日時	2015年5月28日 12時00分									
測定時の環境	天候	晴れ				気圧	hPa			
	気温	・室内	26.1 °C			風速	m/s		風速測定位置	
		・外気	30.4 °C			風向				
測定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
圧力差: ΔP (Pa)	23.6	32.1	40.5	50.2	60.6					
通気量: Q (m ³ /h)	71	84	107	134	160					
通気特性	通気特性式 ($Q = a \Delta P^{1/n}$) ・ $\Delta P=9.8$ Paにおける通気量 $Q_{9.8} =$ 31.8 m ³ /h ・ 隙間特性値 $n =$ 1.16 ・ 通気率 $a =$ 4.4 m ³ /h									
相当隙間面積	係数 $b = 0.627 a^{1/n} =$ 0.677 総相当隙間面積(cm ²) $aA = Q_{9.8} \times b =$ 22 相当隙間面積(cm ² /m ²) $C = aA / S =$ 0.1									
										
測定機関及び測定者										
測定機関	株式会社 マーベックス									
測定者	福西 健一									
